

**23.04.10**

**Abwasserreinigung; Betrieb, Unterhalt**

**ARA Furt, Faulung**

**Vergabe Arbeiten 3. Etappe und Genehmigung Mehrkosten**

### **Ausgangslage**

Mit Stadtrats-Beschluss Nr. 162 vom 21. April 2021 setzte der Stadtrat das Bauprojekt «Schlammfaulung, Kapazitätssteigerung inklusive Sanierung» samt Kostenvoranschlag für die neuen Stapelbehälter sowie die Sanierungen und Erweiterungen bei der Schlammbehandlung mit der Schlamm entwässerung fest. Gleichzeitig bewilligte der Stadtrat zulasten der Investitionsrechnung, Konto 7209.5030.00/INV00201, einen Objektkredit in der Höhe von 7 500 000 Franken (inkl. MWST.) als gebundene Ausgabe sowie die Arbeiten für die erste Etappe.

Im Rahmen des Objektkredits wurden bisher Ausgaben von Fr. 6 467 438.09 (inkl. MWST.) getätigt.

Nach dem Start der zweiten und dritten Etappe hat sich herausgestellt, dass es bei den Ausführungen bzw. Umsetzung der Arbeiten zu Kostensteigerungen kommt. Den Mehrkosten von Fr. 1 843 809.24 (inkl. MWST.) stehen Einsparungen von Fr. 1 018 809.24 (inkl. MWST.) gegenüber, was eine Erhöhung des gesprochenen Kredits von 825 000 Franken (inkl. MWST.) bedeutet.

### **Kostensteigerung**

Zur Kostensteigerung von insgesamt Fr. 1 843 809.24 tragen folgende fünf Gründe bei.

1. Seit Arbeitsstart der zweiten und dritten Etappe bis zum heutigen Zeitpunkt beträgt die Teuerungs bereinigung des Kostenvoranschlags insgesamt ca. 390 000 Franken.
2. Das Honorar der Gesamtplaner hat sich mit den Mehraufwänden der Projekte Schlammstapel, Stand 23. Januar 2024, und Ausführung Etappen zwei und drei, Stand 20. November 2024, um Fr. 431 829.86 erhöht.
3. Die Gebäudelüftung der Schlamm-Entwässerungs-Anlage (SEA) ist aufgrund der angepassten Brandschutz-Anforderungen aufwändiger. Das Gebäude der SEA wurde im ursprünglichen Projekt nur peripher berührt (Leitung durch Keller). In der Baubewilligung wird aber ein Brandschutz- und Lüftungskonzept für die darüberliegende Halle gefordert. Die Mehrkosten betragen 150 780 Franken.



4. Die für die Elektroarbeiten beauftragte Schibli AG, Kloten, macht, gemäss Zusammenstellung der BGG Engineering AG vom 27. November 2024, Mehraufwendungen von total Fr. 427 056.18 geltend. Die Kostenkalkulation für die Elektroarbeiten basierte auf dem Planungsstand von 2020. Die mit Baufortschritt nötigen Angleichungen aufgrund zusätzlich verfahrenstechnischer Anpassung und nicht abzusehenden Erweiterungen mit Kostenfolge wurden der Stadt Bülach fortwährend angemeldet.
5. Kosten aus Regieaufträgen und diversen kleinen Zusatzaufwendungen in der Höhe von Fr. 391 934.38

### Kostenminderung

Die Minderkosten in der Höhe von Fr. 1 018 809.24 begründen sich durch nachfolgende Vergabeerfolge sowie weggefallene Arbeitspositionen in verschiedenen Aufträgen gemäss nachstehender Auflistung.

	Arbeitsgattung	Fr. inkl. MWST.	Bemerkung
BKP 211.1	Baumeister Stapelbehälter	53 235.45	Vergabeerfolg (Teuerung n. b.)
BKP 211.3	Aussenisolation Vorfalraum	96 930.00	Vergabeerfolg
BKP 251	Brauchwasseranlage	20 000.00	weggefallene Position
BKP 321.3	Rührwerke VFR / NFR	16 155.00	Vergabeerfolg
BKP 321.5	Krählwerk Stapelbehälter	28 675.13	Vergabeerfolg (Teuerung n. b.)
BKP 322.2	Anpassung Überschussschlammeindickung	21 540.00	Optimierung / günstigere Lösung
BKP 322.3	Umwälzpumpen VFR	22 416.27	Vergabeerfolg
BKP 322.5	Fremdschlammumpen	18 309.00	nur 1 Pumpe anstatt 2
BKP 325	Schlammwärmetauscher	32 310.00	Vergabeerfolg
BKP 352.2	Schaltanlagen Erneuerung UW03	22 617.00	Vergabeerfolg
BKP 352.3	Schaltanlagen Schlammfäulung UW02	30 156.00	Vergabeerfolg
BKP 521	Vervielfältigungen, Kopien	16 155.00	Aufwand geringer angenommen
BKP 586	UVB	17 468.15	Aufwand geringer angenommen
	Diverse Vergabeerfolge und Einsparungen	122 871.53	Einzelbeträge < Fr. 15'000
<b>Summe</b>		<b>518 838.53</b>	

### Terminplan

Die aktuelle Situation hat auch Auswirkungen auf den Terminplan. Die Umsetzung der Etappen zwei und drei für den Umbau der Faulung sind wie folgt geplant:

	2024				2025			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Etappe 2 (NED zu Vorfalraum)								



Umbau Vorfaulraum								
Sanierung Vorlage Fremdschlamm								
Etappe 3 (Nachfaulraum)								
Umbau Nachfaulraum								
Sanierung Vorlage Frischschlamm								
Projektabschluss								x

**Submission und Vergaben**

Die noch anstehenden und zusätzlichen Arbeiten für die dritte Etappe wurden im dritten Quartal 2024 gemäss nachfolgenden Offerten eingeholt und für bereits erfolgte Arbeiten Nachträge angemeldet.

Alle Angebote wurden durch die Bauleitung geprüft und für in Ordnung befunden.

Die aufgeführten Kosten verstehen sich, sofern nichts genannt wird, inklusive Mehrwertsteuer (MWST.).

a) BKP 211.1 Baumeister Stapelbehälter und Lüftungersatz

Die Mehraufwendungen der Landolt + Co. AG, Kleinandelfingen, betragen, gemäss nachfolgender Zusammenstellung der Bauleitung vom 6. Januar 2025, total Fr. 36 828.05.

Kostenzusammenstellung	Fr. inkl. MWST.
Anpassung Lüftungsöffnungen durch Fassade in Regie (Lüftung SEA-Gebäude)	7 590.70
Diverse Mehrausmass auf Werkvertragspositionen	25 960.35
Zusätzliche Kernbohrungen für Anschlüsse GSM	1 810.30
Verschiebung Aushubmaterial Grabarbeiten	677.80
Zusätzliche Kernbohrungen Elektroerrohre	788.90
<b>Mehraufwendungen gesamt</b>	<b>36 828.05</b>
Bestehender Werkvertrag	879 236.52
Auftragssumme neu	916 064.57

b) BKP 211.2 Kernbohrungen

Auf Einzelanfrage offeriert die Interbohr AG, Dällikon, die Kernbohrarbeiten mit Offerte vom 17. Oktober 2024 zum Betrag von Fr. 3 088.35.



c) BKP 218 Nachtrag Betoninstandsetzung und Innendämmung

Die Erne AG (ehem. Erne decon AG), Birrhard, hat am 21. Oktober 2024 für die Betoninstandsetzung eine Nachtragsforderung eingereicht. In Bereinigung mit der Bauleitung wurde eine Differenz zum bestehenden Werkvertrag gemäss Kostenzusammenstellung in der Höhe von Fr. 96 793.55 als berechtigt vereinbart.

Kostenzusammenstellung	Fr. inkl. MWST.
Bereits ausgeführte Arbeiten Vorfaulraum	482 241.94
Pauschale Betonsanierung Nachfaulraum	183 770.00
Pauschale Betonarbeiten, Wintermassnahmen Nachfaulraum	16 215.00
Gesamttotal	682 226.94
Bestehender Werkvertrag	585 433.39
Erhöhung Auftragssumme bestehender Werkvertrag	<b>96 793.55</b>

d) BKP 242 Heizung / Sanitär

Auf Einzelanfrage offeriert die EO Knecht AG, Zürich, Anpassungen am Wärmetauscher mit Angebot vom 23. Juli 2024 zum Preis von Fr. 59 972.90 inkl. 5 % Rabatt.

e) BKP 242 Heizung / Sanitär

Auf Einzelanfrage offeriert die EO Knecht AG, Zürich, Sanitär- und Dämmungsarbeiten mit Offerte vom 24. Oktober 2024 zum Preis von Fr. 9 826.60 inkl. 5 % Rabatt.

f) BKP 244 Lüftung

Auf Einzelanfrage offeriert die Schmid Hutter AG, Winterthur, die Lüftungsarbeiten mit Angebot vom 18. Oktober 2024 in der Höhe von Fr. 88 216.20.

g) BKP 272 Metallbau, Treppenturm und Stapelbehälter

Die Bauleitung meldet mit Zusammenstellung vom 6. Januar 2025 für die Metallbauarbeiten am Treppenturm Mehraufwendungen der Chromix AG, Affeltrangen, in der Höhe von Fr. 39 875.76.

Kostenzusammenstellung	Firma	Fr. inkl. MWST.
Auftragsvergabe SR 216/2021, 21.4.2021	SD Metallbautechnik AG	96 876.20
Auftragserweiterung vor Erstellung Werkvertrag für zusätzliche Fluchtwegtüre (Anforderungen Brandschutz) und höhere Stahlpreise	SD Metallbautechnik AG	8 590.48
Werkvertragssumme	SD Metallbautechnik AG	105 466.68



Rückbehalt Schlussrechnung SD Metallbautechnik AG		-10 546.48
Mängelbehebung und Fertigstellung Treppenturm	Chromix AG	41 831.77
Aufwand Metallbau Treppenturm gesamt		136 751.97
<b>Mehraufwendungen im Vergleich zu Auftragsvergabe gem. Stadtratsbeschluss 216/2021</b>		<b>39 875.76</b>
Mehraufwendungen im Vergleich zu Werkvertrag		31 285.29

h) BKP 272 Metallbau, Gitterroste UG Schlammfäulung und UG NED

Auf Einzelanfrage offeriert die Peter Bächtold GmbH, Bachenbülach, die Metallbauarbeiten mit Offerte vom 18. September 2024 zum Betrag von Fr. 6 294.93.

i) BKP 322.5 Fremdschlammpumpe

Auf Einzelanfrage offeriert die Rototec AG, Richigen, die Lieferung einer Fremdschlammpumpe mit Angebot vom 6. September 2024 in der Höhe von Fr. 13 739.30.

j) BKP 326.4 Faulwasserabzug

Aufgrund einer Einzelanfrage offeriert die Di-Tec GmbH, Uhwiesen, die Arbeiten für den Faulwasserabzug mit Offerte vom 16. September 2024 zum Preis von Fr. 5 065.90.

k) BKP 341 Beschriftungen, Schilder

Auf Einzelanfrage offeriert die Enigma GmbH, Freienbach, die Lieferung von Beschriftungs-Schildern und Schildträgern mit Angebot vom 5. September 2024 zum Betrag von Fr. 5 777.40.

l) BKP 341 Beschriftungen, Schilder Montage

Auf Einzelanfrage offeriert die Schibli AG, Kloten, die Montage von Beschriftungs-Schildern mit Nachtragsangebot Nr. 03 vom 30. September 2024 in der Höhe von Fr. 16 688.50.

m) BKP 351 Elektroinstallationen

Die Schibli AG, Kloten, macht gemäss der Zusammenstellung der BGG Engineering AG vom 27. November 2024 Mehraufwendungen in der Höhe von Fr. 427 056.18 geltend.

Kostenzusammenstellung	Fr. inkl. MWST.
<i>Total Kosten gemäss Werkverträgen</i>	232 312.95
Nachtrag interne Verbindungen (entfallen bei BKP 231.2)	42 242.58
Nachtrag zus. Trasse UW02	21 482.43
Nachtrag Beleuchtung UW03, Stapelbehälter	31 929.65



Mehraufwendungen Ausmass UW03&Stapelbehälter	85 485.43
Regieleistungen 2022	69 352.95
Regieleistungen 2023	66 439.48
Regieleistungen 2024	110 123.65
<b>Total Mehraufwendungen</b>	<b>427 056.18</b>
<i>Total Aufwendungen</i>	<i>659 369.13</i>

n) BKP 353.1 Messtechnik

Auf Einzelanfrage offeriert die Seitz Messtechnik AG, Berneck, die Messtechnik mit Angebot vom 29. August 2024 in der Höhe von Fr. 102 518.85.

o) BKP 584 Gesamtplaner Ausführung

Die mit der Bauleitung beauftragte Firma Hunziker Betatech AG, Winterthur, meldet mit Ankündigung vom 23. Januar 2024 einen Mehraufwand für das Projekt Schlammstapel in der Höhe von 102 423 Franken. Die Mehraufwendungen wurden an den Koordinationssitzungen laufend kommuniziert, von der Stadt Bülach geprüft und als gerechtfertigt erachtet.

Kostenzusammenstellung	Fr. inkl. MWST.
Teuerungsberichtigung zum KV	8 443.00
Mängelbehebung Treppenturm, Koordinationsaufwand neuer Unternehmer	47 060.00
Zeichnungsaufwand Anpassungen	23 662.00
Anpassung provisorische Fremdschlammbewirtschaftung	3 641.00
Massnahmen Arbeitssicherheit Dach Schlammmentwässerung	9 101.00
Teuerungsberichtigung KV erstellen	2 326.00
Koordination Projekterweiterung Lüftung	5 460.00
Bereinigung Differenzen mit Unternehmer Di-Tec	2 730.00
<b>Total</b>	<b>102 423.00</b>

p) BKP 584 Gesamtplaner Ausführung

Die mit der Bauleitung beauftragte Firma Hunziker Betatech AG, Winterthur, meldet mit Ankündigung vom 20. November 2024 einen Mehraufwand für die Etappen zwei und drei in der Höhe von 119 036 Franken. Die Mehraufwendungen wurden an den Koordinationssitzungen laufend kommuniziert, von der Stadt Bülach geprüft und als gerechtfertigt erachtet.

Kostenzusammenstellung	Fr. inkl. MWST.
Demontage Krählwerk Nacheindicker; Mehraufwand und Statikberechnung	42 846.00
Zusatzaufwand Kostenberichtigung und juristische Abklärungen wegen Erne Decon	37 401.00
Projekterweiterung (Lüftung, Gasinstallation, Optimierungen Faulwasserabzug)	16 866.00



Zeichnungs- und Planungsaufwand durch komplexere Rohrleitungsführung im Leitungsgang, Pumpenkeller	21 923.00
<b>Total</b>	<b>119 036.00</b>

Übersicht aktuelle Vergabeanträge und Nachträge

	Arbeitsgattung	Firma	Fr. inkl. MWST.
BKP 211.1	Baumeister Stapelbehälter und Lüftungersersatz	Landolt + Co. AG	36 828.03
BKP 211.2	Kernbohrungen Nachfaulraum	Interbohr AG	3 088.35
BKP 218	Nachtrag Betonsanierung	Erne AG	96 793.55
BKP 242	Heizung / Sanitär	EO Knecht AG	59 972.90
BKP 242	Heizung / Sanitär	EO Knecht AG	9 826.60
BKP 244	Lüftung	Schmid Hutter AG	88 216.20
BKP 272	Metallbau, Treppenturm Stapelbehälter	SD Metallbautechnik Chromix AG	39 875.76
BKP 272	Metallbau, Gitterroste UG Faulung & UG NED	Peter Bächtold GmbH	6 294.93
BKP 322.5	Fremdschlammpumpe	Rototec AG	13 739.30
BKP 326.4	Faulwasserabzug	Di-Tec GmbH	5 065.90
BKP 341	Beschriftungen, Schilder	Ensigma GmbH	5 777.40
BKP 341	Beschriftungen, Schilder Montage	Schibli AG	16 688.50
BKP 351	Elektroinstallationen	Schibli AG	427 056.18
BKP 353.1	Messtechnik	Seitz Messtechnik AG	102 518.85
BKP 584	Gesamtplaner Ausführung	Hunziker Betatech AG	102 423.00
BKP 584	Gesamtplaner Ausführung	Hunziker Betatech AG	119 036.00
	<b>Summe aktuelle Vergabeanträge</b>		<b>1 133 201.44</b>

Noch offene Vergaben

Nachstehende unter den BKP-Nummern aufgeführten Vergaben sind zeitnah zu vergeben, die Offertanfragen sind jedoch noch ausstehend.


	Arbeitsgattung	Fr. inkl. MWST.
BKP 113.1	Demontagen & Entsorgungen	20 000.00
BKP 211.5	Gerüst für Zustandsuntersuchung Stapelbehälter	10 000.00
BKP 211.5	Beschichtung Stapelbehälter / Nacheindicker	40 000.00
BKP 223	Erdung Blitzschutz	20 000.00
BKP 242	Heizungsanpassungen	20 000.00
BKP 272	Metallbauarbeiten	20 000.00
BKP 285	Malerarbeiten	30 000.00
BKP 326.4	Anpassung Faulwasserabzug	30 000.00



BKP 327	Rohrleitungen Kunststoff	50 000.00
BKP 354.1	Automatisierung SPS / PLS	70 000.00
BKP 355	Provisorien EMSRL	40 000.00
	Summe zeitnahe Vergaben	350 000.00
	Weitere offene Arbeitsvergaben (gerundet) <i>Reserven in Kostenprognosen, kleinere Überschreitungen Auftragssummen im Rahmen KV-Summe, diverse kleinere Abschlussarbeiten</i>	237 000.00
	<b>Total offene Vergaben (gerundet)</b>	<b>587 000.00</b>

### Kostenstand per Ende November 2024

Auf die massgebenden Posten der Mehr- und Minderkosten wurde in der Ausgangslage eingegangen. Gemäss Mitteilung der Bauleitung ergibt sich per Ende November 2024 folgender Kontostand:

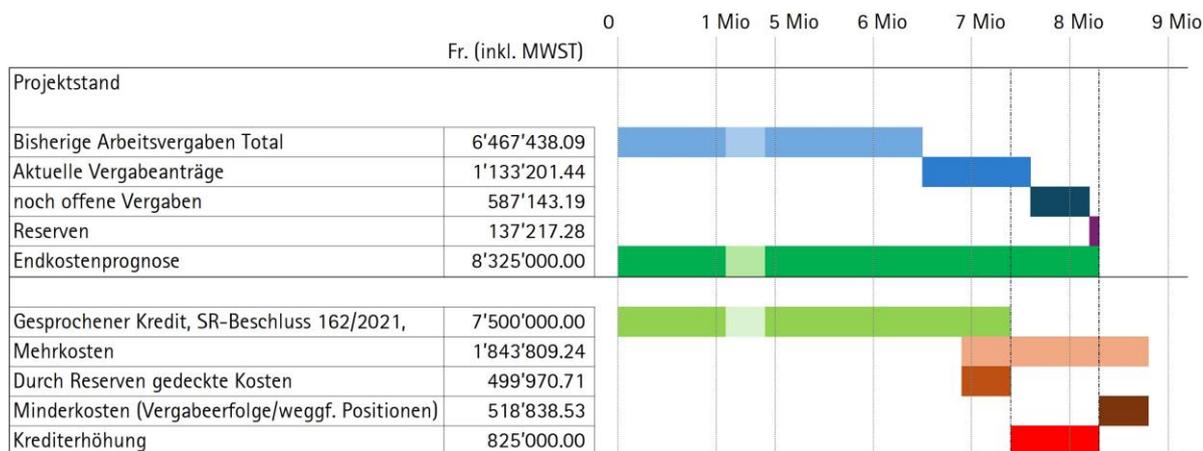

### Budget

Im Investitionsprogramm 2024 - 2028 sind unter dem Konto 7209.5030.00/INV00201, ARA Furt, Umbau Faulturm inklusive Nacheindicker, insgesamt 8.2 Mio. Franken enthalten. Im Budgetjahr 2025 sind 822 000 Franken eingestellt.

### Kredit

Gemäss der Tabelle im Abschnitt „Kostenstand per Ende November 2024“ wird ein zusätzlicher Kreditbedarf von 825 000 Franken inklusive einer Reserve von 137 217 Franken ausgewiesen. Im Budget 2025 sind 822 000 Franken enthalten. Somit ist der Kreditbedarf bis auf 3 000 Franken gedeckt. Die nicht im Budget enthaltenen Ausgaben dürfen trotzdem getätigt werden, da es sich um eine gebundene Ausgabe handelt.



### **Gebundene Ausgabe**

Mit Beschluss Nr. 80 / 2017 erklärte der Stadtrat die erforderlichen Kredite für die Umsetzung der Strategie 2030 bei der ARA Furt als gebundene Ausgaben im Sinne von § 103 Gemeindegesetz (GG). Mit der Bewilligung des Kredites in der Höhe von 7 500 000 Franken mit Beschluss Nr. 162 / 2021 hat der Stadtrat die Gebundenheit erneut bestätigt. Folglich sind auch die Mehrkosten als gebundene Ausgabe zu genehmigen.

### **Subventionen**

Die mit den Bauarbeiten stattfindende Methangasreduktion wird vom AWEL zwingend verlangt. Aufgrund fehlender Freiwilligkeit werden keine Subventionen ausgerichtet.

### **Kostenverrechnung**

Die Verrechnung der Kosten an die Anschlussgemeinden erfolgt via Betriebsrechnung.

Auf Antrag des Ausschusses Bau und Infrastruktur **beschliesst** der Stadtrat:

1. Für die Mehrkosten wird ein Kredit in der Höhe von 825 000 Franken (inkl. MWST.) zulasten der Investitionsrechnung, Konto 7209.5030.00/INV00201 als gebundene Ausgabe bewilligt. Das Total der gebundenen Ausgaben beträgt neu 8 325 000 Franken.
2. Für die Realisierung des Bauprojekts «Schlammfäulung, Kapazitätssteigerung inklusive Sanierung» bei der ARA Furt werden die Arbeiten und Leistungen für die Etappen 2 und 3 zulasten der Investitionsrechnung, Konto 7209.5030.00/INV00201 an folgende Firmen vergeben:
  - a) Die Mehraufwendungen der Landolt + Co. AG, Kleinandelfingen, in der Höhe von Fr. 36 828.05 (inkl. MWST.) gemäss Zusammenstellung vom 6. Januar 2025 werden bewilligt.
  - b) Die Interbohr AG, Dällikon, wird mit den Kernbohrarbeiten gemäss Offerte vom 17. Oktober 2024 zum Betrag von Fr. 3 088.35 (inkl. MWST.) beauftragt.
  - c) Der Erne AG (ehem. Erne decon AG), Birrhard, werden die Arbeiten zu Betoninstandsetzung gemäss der bereinigten Nachtragssumme vom 21. Oktober 2024 in der Höhe von Fr. 96 793.55 (inkl. MWST.) vergeben.



- d) Die EO Knecht AG, Zürich, wird mit den Anpassungen am Wärmetauscher gemäss Angebot vom 23. Juli 2024 zum Preis von Fr. 59 972.90 (inkl. MWST.) beauftragt.
- e) Die EO Knecht AG, Zürich, wird mit den Sanitär- und Dämmungsarbeiten gemäss Offerte vom 24. Oktober 2024 zum Preis von Fr. 9 826.60 (inkl. MWST.) beauftragt.
- f) Der Schmid Hutter AG, Winterthur, werden die Lüftungsarbeiten gemäss Angebot vom 18. Oktober 2024 in der Höhe von Fr. 88 216.20 (inkl. MWST.) vergeben.
- g) Die Mehraufwendungen der Chromix AG, Affeltrangen, gemäss Zusammenstellung vom 6. Januar 2025 in der Höhe von Fr. 39 875.76 (inkl. MWST.) werden bewilligt.
- h) Die Peter Bächtold GmbH, Bachenbülach, wird mit den Metallbauarbeiten gemäss Offerte vom 18. September 2024 zum Betrag von Fr. 6 294.93 (inkl. MWST.) beauftragt.
- i) Der Rototec AG, Richigen, wird die Lieferung einer Fremdschlammpumpe gemäss Angebot vom 6. September 2024 in der Höhe von Fr. 13 739.30 (inkl. MWST.) vergeben.
- j) Die Di-Tec GmbH, Uhwiesen, wird mit den Arbeiten für den Faulwasserabzug gemäss Offerte vom 16. September 2024 zum Preis von Fr. 5 065.90 (inkl. MWST.) beauftragt.
- k) Der Enigma GmbH, Freienbach, wird die Lieferung von Beschriftungs-Schildern und Schildträgern gemäss Angebot vom 5. September 2024 zum Betrag von Fr. 5 777.40 (inkl. MWST.) vergeben.
- l) Die Schibli AG, Kloten, wird mit der Montage von Beschriftungs-Schildern gemäss Nachtragsangebot Nr. 03 vom 30. September 2024 in der Höhe von Fr. 16 688.50 (inkl. MWST.) beauftragt.
- m) Die Mehraufwendungen der Schibli AG, Kloten, gemäss Zusammenstellung der BGG Engineering AG vom 27. November 2024 in der Höhe von Fr. 427 056.18 (inkl. MWST.) werden bewilligt.
- n) Die Seitz Messtechnik AG, Berneck, wird mit der Montage der Messtechnik gemäss Angebot vom 29. August 2024 in der Höhe von Fr. 102 518.85 (inkl. MWST.) beauftragt.



- o) Der Firma Hunziker Betatech AG, Winterthur, werden die Ingenieurleistungen gemäss Anmeldung Mehraufwand vom 23. Januar 2024 für das Projekt Schlammstapel in der Höhe von 102 423 Franken (inkl. MWST.) genehmigt.
- p) Der Firma Hunziker Betatech AG, Winterthur, werden die Ingenieurleistungen gemäss Anmeldung Mehraufwand vom 21. Oktober 2024 für die Etappen 2 und 3 in der Höhe von 119 036 Franken (inkl. MWST.) vergeben.
3. Unvorhergesehene Ausgaben im Rahmen des bewilligten Kredits gemäss Beschlussziffer 1 können in der jeweilig geltenden Finanzkompetenz direkt vergeben werden.
4. Die Hunziker Betatech AG wird beauftragt;
  - die Auftragsvergaben und die Genehmigung der Nachtragsforderungen den jeweiligen Offertstellern schriftlich mitzuteilen.
  - mit den verschiedenen Firmen das verbindliche Bauprogramm zu vereinbaren, soweit notwendig, Werkverträge abzuschliessen und diese der Abteilung Umwelt und Infrastruktur zur Unterzeichnung vorzulegen.
5. Mitteilung an:
  - a) Hunziker Betatech AG, Pflanzschulstrasse 17, 8400 Winterthur (gilt als Auftragsbestätigung)
  - b) BGG Engineering AG, Schokoladenweg 6, 9011 St. Gallen
  - c) Gemeinderat Bachenbülach
  - d) Gemeinderat Winkel
  - e) Gemeinderat Hochfelden
  - f) Gemeinderat Höri
  - g) Gemeinderat Eglisau
  - h) Gemeinderat Stadel
  - i) Zweckverband Abwasserverbund Embrachertal, c/o Gemeinde Rorbas, Kirchgasse 1, 8427 Rorbas
  - j) Andrea Spycher, Stadträtin
  - k) Peter Senn, Leiter Umwelt und Infrastruktur a. i.
  - l) Ralf Winzer, Präsident RPK
  - m) Andreas Scheuss, Präsident Kommission Bau und Infrastruktur
  - n) Christoph Brot, Leiter Infrastruktur
  - o) Stefan Frei, Leiter Siedlungsentwässerung

**Protokoll** Auszug



**Behörde** Stadtrat

Klassifizierung öffentlich

Beschluss-Nr. 74

Sitzung vom 26. Februar 2025

p) Erich Schmid, Leiter ARA Furt

**Stadtrat Bülach**

Mark Eberli  
Stadtpräsident

Marcel Peter  
Stadtschreiber a. i.
